

2023 年度 第 6 回 取締役会議事録

(株)掛川電気引込工事センター

1. 招集年月日 2024 年 1 月 19 日
2. 開催日時及び場所 2024 年 3 月 15 日 取締役会 15:00～15:35
掛川電気会館 2F 会議室
3. 取締役の数及び出席取締役の数
取締役 6 名 出席取締役 6 名
4. 出席取締役の氏名
(代表取締役社長)中村 修 (常務取締役)鶴田昌伸
(取締役)阿形正好、鈴木基文、木村正勝、栗本光康
5. 出席監査役の氏名
無し
6. その他の出席者氏名
事務長 水野智義
7. 議長の氏名
中村 修
8. 議決事項に特別の利害関係を有する取締役の氏名
なし
9. 議事の経過の要領及び議案別の議決の結果
■全ての議案は出席取締役の全員賛成多数決議により、全て可決承認された。

定刻になり定款の規程により中村代表取締役社長の挨拶後、議長席について開会する旨を述べて議事に入った。
議長は、先ず、事務長に会議の進行を委任した。
これにより、事務長は事前資料レジュメに沿って会議の開始をした。

■議題審議

第1号議案:2024年度 定時株主総会対応及びシナリオ等について (連絡)

今年の6月の総会は実施予定ですが、懇親会を含め希望者のみ出席と致します。
総会の直前1か月前に5類感染症等、重篤な感染症拡大が懸念される場合は、縮小総会とします。
事務長作成の総会資料は印刷前の5月初旬までに、
事前にPDFにて各取締役へメール送付いたしますので、
取締役の役割責任として、必ず資料のご確認と間違いや修正の必要な指摘事項の抽出をお願い致します
株主様へ配布する大切な総会資料ですので、間違い項目は事務長まで
速やかに又は5月13日までに連絡をお願い致します。
(また、当日の役割分担も作成して送付いたしますので、併せて宜しくお願い致します)

株主総会運営における、シナリオについては5月27日(月)までに事前メール送付します。
電気会館にて、5月31日(金)(13:30～)の取締役会にて
当日の読み合わせを行いますので必ず出席して下さい。
(継続して、役員会を開催して中部電力PG㈱、(一財)中部電気保安協会と意思統一を図ります)

第2号議案:2024年度の実施予定の耐電圧試験について (報告)

【資料1】

標題における㈱トーエネックサービスにおける2024年度上期の日程表が届きました。
別紙にてご連絡いたします。
ホームページにも公開しています。

第3号議案:技能認定結果について (報告)

昨年の11月～12月に実施した昇柱・計器・監督・地上の訓練の結果は認定委員会として
中部電力PG㈱、取締役、委員会のメンバーの引込線及び内線工事技能判定点検評価票により
全員が合格されました。
6月20日(木)の契約更新安全講習会(掛川生涯学習センター)の日に認定証をお渡し致します。

第4号議案:Sの再認定(技能維持)及び新規訓練について (連絡)

共同受注規程のコンプライアンス対応として、Sランク訓練を実施します。

場所 中電㈱菊川配電センター
指導者 中電㈱の5名
支援者 中村代表取締役社長、直営班(専任班の各社1名ずつ)

■直営班(協力班7社)の技能維持訓練実施いたします…日時は未定

第5号議案:今年度の決算収益見込みについて (報告)

今年度末の決算においての収益について、利益は昨年度同等くらいの150万円程度の予測です。

第6号議案:今年の技能オリンピックについて (報告)

2月8日に株主の皆様へFAX発信しました通り
2024年の技能オリンピックの開催はありません。
しかし、代わりに技術研修会を実施する予定ですので、ご承知おき願います。

第7号議案:耐電圧試験結果について(報告)

■2023年度(下期)における防具の耐電圧試験に関しては、3月4日に実施完了しました。

未実施…掛川BLは2事業所、菊川BLは1事業所、南部BLは2事業所、袋井BLは1事業所、
森・山梨BLは1事業所、磐田BLは8事業所

不良点数…掛川BLの1事業所で高圧用長靴1点、菊川BLの1事業所で高圧用手袋1点、
南部BLの1事業所で高圧用手袋1点、磐田BLの1事業所で高圧用手袋1点

第8号議案:1月の委託作業安全推進会議の議事録公開について (報告)

【別紙2】

2月7日に中部電力PG(株)掛川支社と標題の会議を実施しました。

別紙による内容を株主様へご報告・情報公開をいたします。

第9号議案:センターの1月度、2月度の月次業務実績報告について(報告)

【別紙3】

標題の実績報告を別紙のように株主様へご報告・情報公開をいたします。

第10号議案:安全パトロールについて(報告)

【別紙4】

■1月度の安全パトロールを、4件実施しました。

■2月度の安全パトロールを、5件実施しました。

➤ 別紙による内容を株主様へご報告・情報公開をいたします。

詳細報告書や写真等はホームページに掲載しますので、ご確認願います。

第11号議案:重要議案提案について(連絡)

今回の取締役会において、各取締役からの重要議案の提出はありませんでした。

第12号議案:(県)協力会情報について(連絡)

2月2日に中村代表取締役及び鶴田常務取締役が静岡県電気工事協力会取締役会の
委託作業安全推進会議に出席されましたので、

情報連絡を会議後のミーティングにてお知らせ致します。

<次回の開催日>

2024年5月31日(金)	取締役会	13:30~15:30	掛川電気会館	2F 会議室
	役員会	15:30~16:30	(同上)	

上記のとおり議事の顛末を記録し、ホームページに掲載する。

出席取締役全員が記名捺印後、原紙は事務長が保管する事とする。

2024 年 3 月 15 日

代表取締役社長	中	村	修	印
常務取締役	鶴	田	昌伸	印
取締役	阿	形	正好	印
取締役	鈴	木	基文	印
取締役	木	村	正勝	印
取締役	栗	本	光康	印

2023 年度

【第 6 回 取締役会資料】

2024.3.15

(株)掛川電気引込工事センター

4月																															
社名	曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
㈱トーエネック	事業場		静岡	静岡	静岡	静岡		移動	浜松東	浜松東	浜松東	浜松東	浜松東			浜松東	浜松東	浜松東	浜松東	浜松東	土	移動	浜北	浜北	浜北	浜北	浜北				
品名			保防庄へ高ト	保防庄へ高ト	保防庄へ高ト	保防庄へ高ト		保防庄へ高ト	保防庄へ高ト	保防庄へ高ト	保防庄へ高ト	保防庄へ高ト	保防庄へ高ト			保防庄へ高ト	保防庄へ高ト	保防庄へ高ト	保防庄へ高ト	保防庄へ高ト	保防庄へ高ト	保防庄へ高ト	保防庄へ高ト	保防庄へ高ト	保防庄へ高ト	保防庄へ高ト	保防庄へ高ト				
作動油																															
備考																															
→ 保護員の前庄は5/7までに完了 →																															
5月																															
社名	曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
㈱トーエネック	事業場																														
品名																															
作動油																															
備考																															
→ 保護員の前庄は5/7までに完了 →																															
6月																															
社名	曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
㈱トーエネック	事業場																														
品名																															
作動油																															
備考																															
→ 保護員の前庄は5/7までに完了 →																															
7月																															
社名	曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
㈱トーエネック	事業場																														
品名																															
作動油																															
備考																															
→ 保護員の前庄は7/9までに完了 →																															
8月																															
社名	曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
㈱トーエネック	事業場																														
品名																															
作動油																															
備考																															
→ 保護員の前庄は7/9までに完了 →																															
9月																															
社名	曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
㈱トーエネック	事業場																														
品名																															
作動油																															
備考																															

社長	事務長
	

【 議 事 録 】

作成者： 小野

作成日： 2024 年 2 月 26 日

会議名	2023 年度下期 委託作業安全推進会議
開催日時	2024 年 2 月 7 日(水) 10:00~11:30
場所	掛川電気会館 2 階会議室
出席者 (計 6 名)	中部電力 PG(株) : 田中配電建設グループ長 掛川支社 和田配電技術統括長 村松副長 センター : 中村社長 鶴田常務 小野主査

挨拶

(株)掛川電気引込工事センター 中村社長

- ・センター社長に就任後、初めて開催する委託作業安全推進会議である。
- ・能登半島地震対応の最中、会議へ出席いただき感謝申し上げます。
- ・本日は中部電力 PG(株)様ご協力のもと、安全について議論したい。

中部電力 PG(株) 田中配電建設グループ長

- ・新型コロナウイルスの影響で委託作業安全推進会議を自粛していた事情があり、久しぶりの開催となる。
- ・安全について定期的に意思疎通することは非常に大切であり、今後も計画的に開催をお願いしたい。
- ・下期に入ってから、9 月に委託店で低圧感電災害が発生し、11 月にはトーエネックで高圧感電事象が発生している。単一年度で 2 件の感電が発生した事を重く受け止めており、本日は安全に関してディスカッション出来たらと思う。

議題1:2023 年度上期 配電部門災害発生状況ならび 2023 年度上期 安全パトロール

結果について

資料No. 1~5

中部電力 PG(株)村松副長より、資料より一部抜粋の上、安全に対する注意喚起を実施した。

- ・監督者の適格な指示のもと、交通誘導員と監督者が連系し公衆の安全を守ること。
- ・万が一、歩行者の転倒など事故が発生した場合は、被害者に対して受診を勧める事も大切。
- ・総括して、虫さされ災害が 9 件、熱中症 2 件と一昨年と比較すると件数としては大幅に減少している。春先から夏にかけて両災害は増加するため注意喚起をお願いしたい。

・参考として、中部電力PG(株)では「危険生物」対策の手引を制定している。時期および注意ポイントが分かる資料となっており、活用している。

⇒会議終了後、引込センターへ手引のデーターを送信済。

・静岡県電気工事組合での発生は無く、安全作業に努めていただき有難く思う。

中部電力PG(株)和田配電技術統括長

公衆保安については、車輛だけではなく“作業エリアを囲む”ことも重要である。

議題2:2023 年度 協力会安全管理基本計画(中間報告)について

資料No. 6

センター中村社長より、資料に沿って説明を行なった。

・掛川センターでは、直営班の安全パトロールを他センターより手厚く実施している。

・慣れている作業に対する油断が災害につながる場合もあり、安全パトロールで確認する事は効果があると考ええる。

田中配電建設グループ長

・安全パトロールのチェック票は、安全管理基本計画の最新の重点項目とリンクしている事が重要である。

・直近で、センター直営班(㈸中泉電気工業)の安全パトロールを実施予定であり、安全管理基本計画の各項目が出来ているかチェックする。

議題3:各電気引込工事センター教育訓練実施状況と2022 年度 下期安全パトロール

結果について

資料No. 7~8

センター中村社長より、資料に沿って説明を行なった。

議題4:その他

(1)中部電力PG(株)村松副長

2023 年 9 月 27 日中部電力PG(株)旭名東支社 配電建設 G で発生した低圧活線作業中の感電事象を受けて、掛川センターの具体的な対策を確認したい。

センター中村社長、センター鶴田常務

・“労働災害の撲滅に向けた安全宣言”に基づき、安全パトロールおよび技能認定訓練の場で教育を実施していく。

・この感電事象については、作業長は作業者に対し柱上待機を指示しており、作業者が指示なく防護・保護具を外したこと、カバーの取付不全で活線部分を露出させたことが問題であり、対策としては作業者の安全教育が必要と考えられる。

中部電力 PG(株)村松副長

・直営班におけるトランシーバーの配備状況は？

⇒センター中村社長 詳細は不明、直営班各社の判断に任せている。

・仮足場の取付要否について、安全作業必携には具体的な仮足場の取付基準が無い。適材適所であると考えてるが、判断基準を確認したい。

⇒センター中村社長 質問：仮足場は中部電力 PG(株)において“安全な足場”に該当するのか？

仮足場を取付するより、使用可能であれば高所作業車を使用する方が良いのではと思ってしまう。仮足場があってもバランスを崩せば今回の感電事象と同じ状況になる。

⇒中部電力 PG(株)和田配電技術統括長

足場金具は、足場として問題無く使用可能。基準は、作業内容や作業姿勢などで適宜判断している。

(2)センター小野

感電に関する事で、建設用の足場がある現場で引込線を取付(送電)して欲しいと工事店様から希望される事が時々あり、都度、感電の危険性を伝え断っているが納得されない方もおり、中部電力 PG(株)へ相談するも部署によって対応が異なるため、今一度“足場がある現場での送電”についての見解を確認したい。

⇒中部電力 PG(株)村松副長

- ・引込線が他の建造物に接触することは容認出来ないため、その場合は作業を止めること。
- ・送電を強要された場合は、設計や検査へ連絡→申込者に対し、是正処置・工期調整を実施する。
- ・危険を知っていて施工すると、労働安全衛生法違反に問われることになる。
- ・個別の件名に対する問い合わせは、まず設計へ。連絡がつかない場合は検査へ相談して欲しい。
- ・設計、検査担当へ共有する。

以上

社長	事務長	報告者
		

【 掛川電気引込工事センター 月次報告書 】

期間 : 2024年1月9日～1月31日

●伝票付託枚数 中部電力PG(株) ⇒ センター

	掛川	磐田	計
寺井電機	242	0	242
浜電工業(株)	83	0	83
(有)中泉電気工業	3	186	189
計	328	186	514

●協力工事店へのスイッチング工事 付託枚数 ※上記に含まず

	掛川	磐田	計
(有)竜東電気工事商会	0	0	0
計	0	0	0

●竣工実績(施工件数)

	引込線工事	計器工事	スイッチング工事	点検・改修工事	計
寺井電機(株)	213	85	0	1	299
浜電工業(株)	48	22	0	0	70
(有)中泉電気工業	190	80	0	11	281
計	451	187	0	12	650

●手直票の発行状況

寺井電機(株)

浜電工業(株)

(有)中泉電気工業

} ありませんでした。

●クレーム、その他

ありませんでした。

社長	事務長	報告者
		

【 掛川電気引込工事センター 月次報告書 】

期間：2024年2月1日～2月29日

●伝票付託枚数 中部電力PG(株) ⇒ センター

	掛川	磐田	計
寺井電機	272	0	272
浜電工業(株)	81	0	81
(有)中泉電気工業	2	197	199
計	355	197	552

●協力工事店へのスイッチング工事 付託枚数 ※上記に含まず

	掛川	磐田	計
(有)竜東電気工事商会	0	0	0
計	0	0	0

●竣工実績(施工件数)

	引込線工事	計器工事	スイッチング工事	点検・改修工事	計
寺井電機(株)	241	94	0	6	341
浜電工業(株)	78	30	0	0	108
(有)中泉電気工業	203	71	0	24	298
計	522	195	0	30	747

●手直票の発行状況

	内容	結果
寺井電機(株) 計1件	VCT座金位置不良、SM外部アンテナ外出、乙品PJカバーの使用 (改修済)	寺井電機(株)にて 内容確認済
浜電工業(株) 計1件	取り付けたポリ管がずれていました。改修をお願いします。	浜電工業(株)にて 手直し完了済
(有)中泉電気工業 計1件	引込線の道路高不足です。(4.7m) 設計チームと調整して道路高確保をお願いします。	(有)中泉電気工業にて 手直し完了済

●クレーム、その他

ありませんでした。

【 センター直営班 安全パトロール実績集計表 】

2023年度



上期計(件数)	下期計(件数)	上期・下期計(件数)
29	25	54

上期

実施月日	実施件数	実施者	直営班名	備考
4月12日(水)	2	高塚	寺井電機(株)	
4月19日(水)	1	高塚	浜電工業(株)	
4月26日(水)	—	高塚	(有)中泉電気工業	大雨のため中止
5月10日(水)	2	高塚	寺井電機(株)	
5月24日(水)	2	高塚	浜電工業(株)	
5月31日(水)	1	高塚	(有)中泉電気工業	
6月7日(水)	2	高塚	寺井電機(株)	
6月14日(水)	—	高塚	浜電工業(株)	工事無しのため中止
6月28日(水)	1	高塚	(有)中泉電気工業	
7月4日(火)	—	高塚	浜電工業(株)	工事無しのため中止
7月11日(火)	2	高塚	寺井電機(株)	
7月21日(金)	1	高塚	(有)中泉電気工業	
7月26日(水)	2	高塚	浜電工業(株)	
8月9日(水)	2	高塚	浜電工業(株)	
8月23日(水)	2	高塚	寺井電機(株)	
8月29日(火)	2	高塚	(有)中泉電気工業	
9月13日(水)	2	高塚	寺井電機(株)	
9月20日(水)	3	高塚	浜電工業(株)	
9月27日(水)	2	高塚	(有)中泉電気工業	

合計日数 16

実施件数合計 29 (寺井電機 12) (浜電工業 10) (中泉電気 7)

下期

実施月日	実施件数	実施者	直営班名	備考
10月11日(水)	1	高塚	寺井電機(株)	
10月18日(水)	2	高塚	浜電工業(株)	
10月25日(水)	2	高塚	(有)中泉電気工業	
11月1日(水)	2	高塚	寺井電機(株)	
11月10日(水)	—	高塚	(有)中泉電気工業	大雨のため中止
11月15日(水)	2	高塚	浜電工業(株)	
11月28日(火)	—	高塚	(有)中泉電気工業	中止
12月6日(水)	2	高塚	浜電工業(株)	
12月8日(金)	1	高塚	寺井電機(株)	
12月19日(火)	2	高塚	(有)中泉電気工業	
12月20日(水)	2	高塚	(有)中泉電気工業	
1月17日(水)	—	高塚	寺井電機(株)	中止
1月26日(金)	2	高塚	浜電工業(株)	
1月30日(火)	2	高塚	(有)中泉電気工業	
2月7日(水)	2	高塚	寺井電機(株)	
2月14日(水)	1	高塚	浜電工業(株)	
2月21日(水)	1	高塚	(有)中泉電気工業	
2月28日(水)	1	高塚	寺井電機(株)	
3月				

合計日数 15

実施件数合計 25 (寺井電機 7) (浜電工業 9) (中泉電気 9)

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株) 掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人




実施年月日	2024 年 1 月 26 日 (金)
1. 実施時間	09:00 ~ 10:10
現場住所 引込柱	御前崎市下朝比奈62シ882
直営班 (会社名)	浜電工業㈱
現場作業者名	本杉亘 松浦俊行 松田稜詞 大串和樹
パトロール者所見	1. KYは口頭で監督者が危険個所を指示する事で実施されていました。 ・不明点については、質問等され打合せがされていました。 2. 弱電にシートをかぶせて、DV線が擦りそうな力所に保護がされていました。 3. DV線の車両から引き出し力所、毛布が下に敷かれ、DV線の保護がされていて良かったです。 4. 電柱側DV線支持において、巻きじりが丸めてあり、活線部分に接触しないようにされていて良かったです。

※現場写真は別紙参照

安全パトロール

御前崎市下朝比奈 62シ882

浜電工業(株)

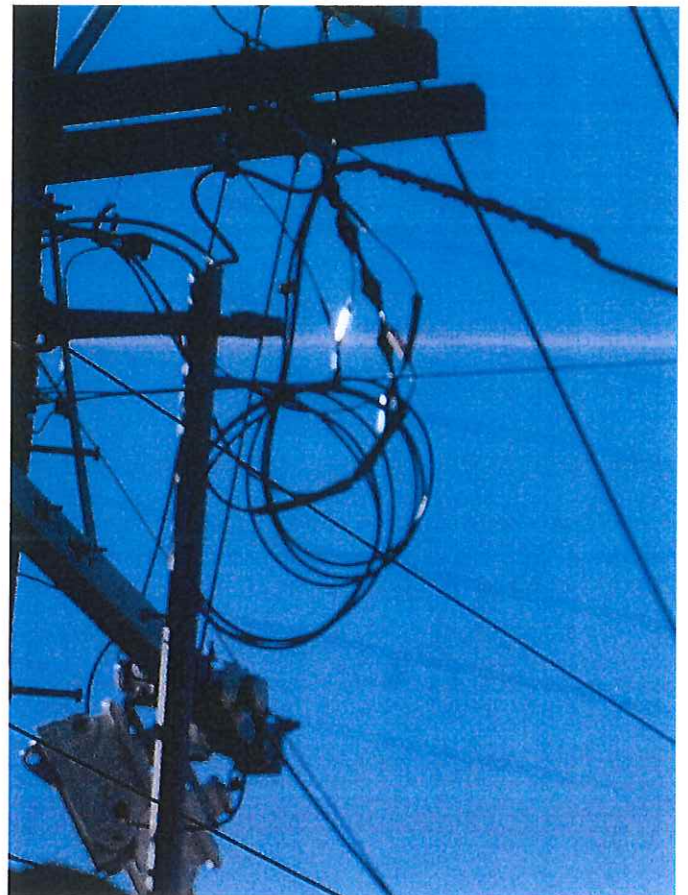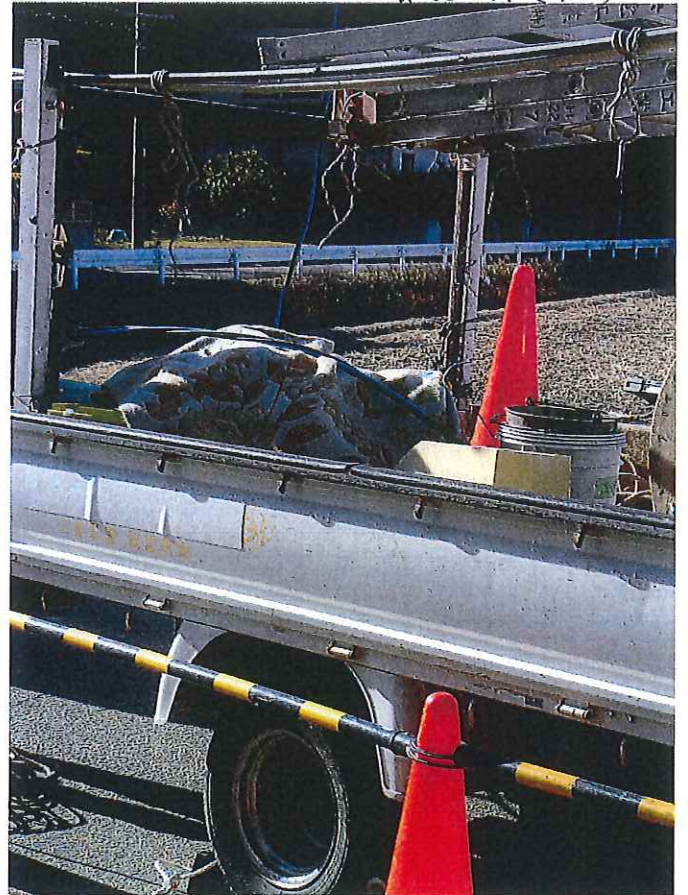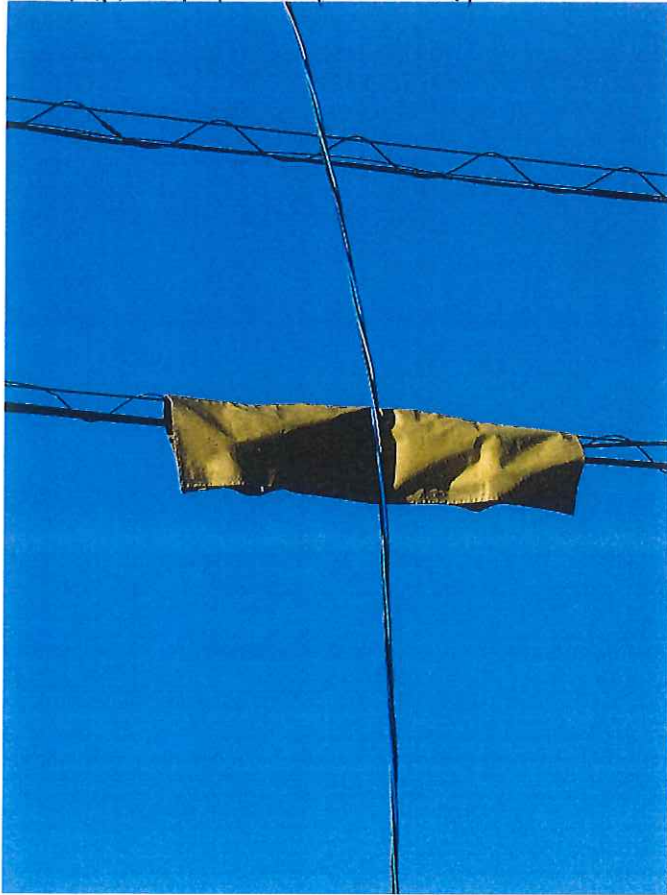

高
24.1.26
要

安全パトロール票

共同受注業務規程 (別紙8)

実施年月日	令和 6年 1月 26日 (金)
実施場所	御前崎市下朝比奈 62シ882
工事内容	22DV3メッセセン吊新設
パトロール対象	(引込線工事) ・ 計器工事 ・ 屋内線工事 ・ 店舗
対象工事店名	浜電工業㈱
工事店区分	(センター直営班) ・ 協力工事店A ・ 協力工事店B ・ 協力工事店C

重点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
一般	1 服装はよい	○	○
	2 作業人員は適正か	○	○
	3 「直営従業員名簿」記載の作業員か	○	○
	4 安全作業必須は携帯しているか	○	○
	5 健康状態はよい	○	○
	6 委託証は携帯しているか	○	○
出発前確認	11 工具・保護具・防具・活線用絶縁工具は損傷が無いように保管されているか	○	○
	12 作業現場に必要な工具、測定器具等の準備はできているか	○	○
	13 携行品はよい (電気工事士免許・運転免許証・安全必須・工事伝票・その他必要書類)	○	○
作業中確認	18 TBMにより、作業者に対する作業内容の周知はよい	○	○
	19 K Yの実施はよい	○	○
	23 ゴム手袋の着用前点検はよい	○	○
昇降柱前点検	24 電柱、支線の地盤点検を実施したか	○	○
	25 無墜落柱上安全帯の使用前点検はよい	○	○
	26 フルハース (感震制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の点検状況はよい	○	○
柱上作業	27 安全帯D環付近にフック取付時に鈍角が付いていないか	○	○
	28 昇柱登降の確認はよい	○	○
	29 3点支持での昇降柱動作ができているか	○	○
柱上作業	30 検電はよい	○	○
	31 昇降設備の設置状況はよい	○	○
	32 昇柱用梯子等の使用状況はよい	○	○
柱上作業	33 昇柱動作はよい	○	○
	36 フルハース (感震制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の使用状況はよい	○	○
	37 柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよい	○	○
柱上作業	38 小柱への昇柱方法は適切か	○	○
	39 防具の取付・取外方法はよい	○	○
	40 保護具・防具の使用はよい	○	○
柱上作業	41 安全帯はよい	○	○
	42 フルハースのフックの取付位置はよい	○	○
	43 通い綱の使用状況はよい	○	○
柱上作業	46 踏み抜き防止措置はよい	○	○

パトロール者所見 (状況により現場状況等も記入する。)

所要の要否	要・不要
-------	------

走行距離 86.165km ~ 86.193km

県協力会使用欄	センター使用欄
---------	---------

重点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
計器工事	49 作業責任者は防犯等を着用しているか	○	○
	50 作業責任者の監視・指示は適切か	○	○
高所作業車	52 作業開始前の点検はよい	○	○
	53 安全作業工具類 (計器工事用短絡防止キャップ・絶縁ドライバー・安全マスコ) の使用はよい (計器活線時)	○	○
	57 設置場所はよい	○	○
その他	58 有資格者 (技能講習受講者) であるか	○	○
	59 高所作業車の操作方法はよい	○	○
	60 ハックアップ内での作業は適切か	○	○
その他	61 輸送時の活用状況はよい	○	○
	62 使用前の規制装置動作確認はよい	○	○
	63 高所作業車での安全作業・作業区域の確保はよい	○	○
その他	65 公衆保安の確保 (誘導員・セーフティコーン、作業区画の設置) はよい	○	○
	66 送電後の確認はよい	○	○
	67 個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか	○	○
その他	68 重量物の運搬・吊り上げ方法はよい	○	○
	69 自主検査はよい	○	○

重点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
店鋪パトロール	1 安全啓蒙に関する掲示 (ポスター・標語など)	○	○
	2 安全諸活動の記録の保管状況 (教育・KYなど)	○	○
	3 非常時の連絡体制図などの掲示	○	○
店鋪パトロール	4	○	○
	5	○	○
	6 電気工事法 (建設業法) に基づく登録・届出	○	○
店鋪パトロール	7 電気工事者の登録 (届出) 標識の掲示 (店舗・現場)	○	○
	8 労働者名簿・技能資格などの管理状況	○	○
	9 関係法令・規程類の常備状況 (電技・内規・電気工事2法等)	○	○
店鋪パトロール	10 しゅん工記録・自主点検表などの記録保管状況	○	○
	11	○	○
	12	○	○
店鋪パトロール	13 個人情報取扱者の限定	○	○
	14 個人情報取扱の記録の保管・管理状況 (持ち出し・施設など)	○	○
	15 個人情報の複写等における扱いと返却・破棄の管理	○	○
店鋪パトロール	16	○	○
	17	○	○
	18 保護具・防具類の保管状況	○	○
店鋪パトロール	19 保護具・防具類の点検 (耐圧試験) 記録の保管状況	○	○
	20 工具類の点検整備状況と記録の保管状況	○	○
	21 測定器類の保管状況と点検 (校正試験) 記録の保管状況	○	○
店鋪パトロール	22 倉庫等の資機材の整理整頓状況	○	○
	23	○	○
	24	○	○

県協力会使用欄	センター使用欄
---------	---------

フォローの実施結果 (実施月: 月 日) 良・否

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人

実施年月日	2024 年 1 月 26 日 (金)
1. 実施時間	10:25 ~ 11:50
現場住所 引込柱	牧之原市鬼女新田 59ソ091
直営班 (会社名)	浜電工業㈱
現場作業者名	本杉亘 松浦俊行 松田稜詞 大串和樹
パトロール者所見	1. KYは口頭で監督者が危険個所を指示する事で実施されていた。 ・不明点での質問が出されていた。(理解した中で作業に入っていた。) 2. お互いに声を出し、確認し合って作業が進められていた。 3. 交差点の角に高所作業車を設置しての作業であったが、通行車両の右折車等交通誘導員の適切な誘導がされていた。 4. 検査・輪止め設置状況良好

※現場写真は別紙参照

安全パトロール

牧原市鬼母新田 59-1091

浜電工業(株)



安全パトロール票

共同受注業務規程 (別紙8)

実施年月日	令和 6年 1月 26日 (金)
実施場所	牧之原市鬼女新田 593091
工事内容	38DV3メッセセン吊新設
パトロール対象	（引込線工事）・ 計器工事 ・ 屋内線工事 ・ 店舗
対象工事店名	浜電工業㈱
工事店区分	（センター直営班）・ 協力工事店A ・ 協力工事店B ・ 協力工事店C

重点	チェック項目	作業員	作業責任者
1	服装はよい	○	○
2	作業人員は適正か	○	○
3	「直営従業員名簿」記載の作業員か	○	○
4	安全作業必須は携帯しているか	○	○
5	健康状態はよい	○	○
6	委託証は携帯しているか	○	○
11	工具・保護具・防具・密着用絶縁工具は損傷が無いように保管されているか	○	○
12	作業現場に必要な工具、測定器具等の準備はできているか	○	○
13	携行品はよい（電気工事士免状・運転免許証・安全必須・工事伝票・その他必要書類）	○	○
18	TBMにより、作業員に対する作業内容の周知はよい	○	○
19	KYの実施はよい	○	○
23	ゴム手袋の着用前点検はよい	○	○
24	電柱・支線の地盤点検を実施したか	○	○
25	無墜落柱上安全帯の使用前点検はよい	○	○
26	フルハーネス（懸着禁止用器具）および安全帯（ワークポジショニング用器具）の点検状況はよい	○	○
27	安全帯D環付近にフック取付時に鑑賞しやすい物が付いていないか	○	○
28	昇柱経路の確認はよい	○	○
29	3点支持での昇降柱動作ができているか	○	○
30	検電はよい	○	○
31	昇降設備の設置状況はよい	○	○
32	昇柱用梯子等の使用状況はよい	○	○
33	昇柱動作はよい	○	○
36	フルハーネス（懸着禁止用器具）および安全帯（ワークポジショニング用器具）の使用状況はよい	○	○
37	柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよい	○	○
38	小柱への昇柱方法は適切か	○	○
39	防具の取付・取外方法はよい	○	○
40	保護具・防具の使用はよい	○	○
41	安全呼称はよい	○	○
42	フルハーネスのフックの取付位置はよい	○	○
43	通い綱の使用方法はよい	○	○
46	踏み抜き防止措置はよい	○	○

パトロール者所見（状況により現場状況等も記入する。）

フォローの要否	要・不要
---------	------

県協力会使用欄	センター使用欄
	24.1.30

重点	チェック項目	作業員	作業責任者
49	作業責任者は腕章等を着用しているか	○	○
50	作業責任者の監視・指示は適切か	○	○
52	作業開始前の点検はよい	○	○
53	安全作業工具類（計器工事用短絡防止キャップ・絶縁ドライバー・安全マスク）の使用はよい（計器活線時）	○	○
57	設置場所はよい	○	○
58	有資格者（技能講習受修者）であるか	○	○
59	高所作業車の操作方法はよい	○	○
60	ハケット内での作業は適切か	○	○
61	輪留めの活用状況はよい	○	○
62	使用前の規制装置動作確認はよい	○	○
63	高所作業車での安全作業・作業区域の確保は出来ているか	○	○
65	公衆保安の確保（設置員・セーフティコーン、作業区画の設置）はよい	○	○
66	送電後の確認はよい	○	○
67	個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか	○	○
68	重量物の運搬・吊り上げ方法はよい	○	○
69	自主検査はよい	○	○

その他

店舗パトロール	チェック欄	
1	安全啓蒙に関する掲示（ポスター・標語など）	○
2	安全啓蒙活動の記録の保管状況（教育・KYなど）	○
3	非常時の連絡体制図などの掲示	○
4		○
5		○
6	電気工事業法（建設業法）に基づく登録・届出	○
7	電気工事業の登録（届出）標識の掲示（店舗・現場）	○
8	労働者名簿・技能資格などの管理状況	○
9	関係法令・規程類の常備状況（電技・内規・電気工事2法等）	○
10	しゅん工記録・自主点検表などの記録保管状況	○
11		○
12		○
13	個人情報情報の取扱者の限定	○
14	個人情報情報を記した書類等の保管・管理状況（持ち出し・施設など）	○
15	個人情報情報の複写等における扱いと返却・破棄の管理	○
16		○
17		○
18	保護具・防具類の保管状況	○
19	保護具・防具類の点検（耐圧試験）記録の保管状況	○
20	工具類の点検整備状況と記録の保管状況	○
21	測定器類の保管状況と点検（校正試験）記録の保管状況	○
22	倉庫等の資機材の整理整頓状況	○
23		○
24		○

フォローの実施結果（実施月： 月 日） 良・否

県協力会使用欄	センター使用欄

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人


実施年月日	2024 年 1 月 30 日 (火)
実施時間	10:30 ~ 11:10
現場住所 引込柱	磐田市中泉 55モ258
直営班 (会社名)	(有)中泉電気工業
現場作業者名	岡田典久 遠藤和宏 椎葉幹彦 生子晴康 小林尊之
パトロール者所見	1. 交通量の多い歩道のある交差点手前での高所作業車を設置しての作業であった。 ・歩行者通路も確保され、交通誘導員も配置されていて良かったです。 ・歩道側の歩行者通路も、カラーコーンが設置されていました。 2. 相図、応答がしっかりされ作業が進められていました。 3. 道路横断でDV線を引き上げる場面で、作業者、監督者、交通指導員の連絡を取り合いスムーズに電線が引き上げられていました。(通行車両はストップ)

※現場写真は別紙参照

安全パトロール

磐田市中泉 55モ258

(有)中泉電気工業

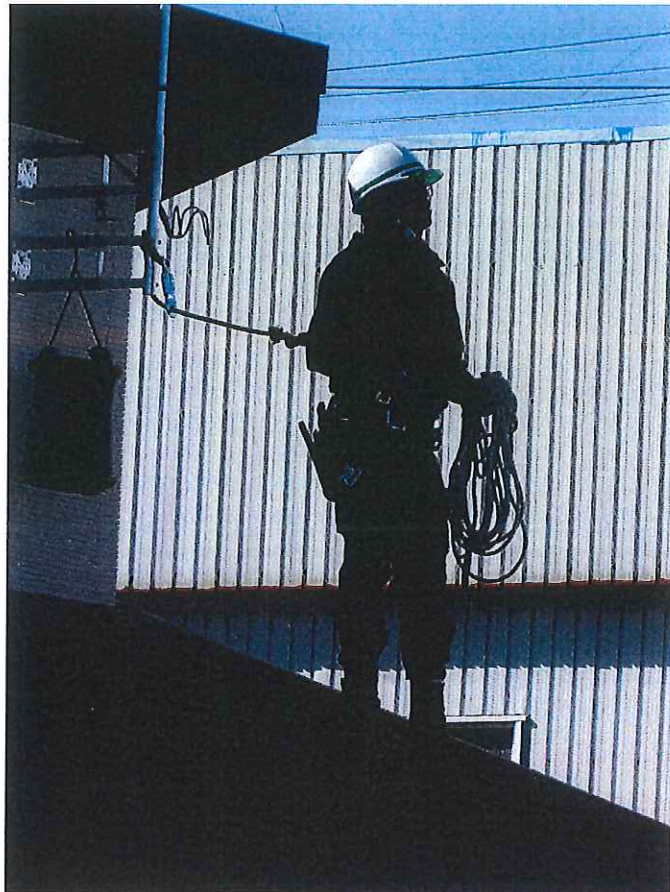

安全パトロール票

共同受注業務規程 (別紙8)

実施年月日	令和 6 年 1 月 30 日 (火)
実施場所	磐田市中泉 55モ258
工事内容	吊引込14DV3×1新設(メッセン要)
パトロール対象	引込線工事・屋内線工事・店舗
対象工事店名	㈱中泉電気工業
工事店区分	センター直営班・協力工事店A・協力工事店B・協力工事店C

重点	チェック項目	作業責任者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
一般	1 服装はよい	○	○
	2 作業人員は適正か	○	○
	3 「恒常従業員名簿」記載の作業員か	○	○
	4 安全作業必須は携帯しているか	○	○
	5 健康状態はよい	○	○
	6 委託証は携帯しているか	○	○
出発前確認	11 工具・保護具・防具・活動用絶縁工具は損傷が無いように保管されているか	○	○
	12 作業現場に必要な工具・測定器具等の準備はできているか	○	○
	13 携行品はよい (電気工事士免状・運転免許証・安全必須・工事伝票・その他必要書類)	○	○
昇降柱前点検	18 TBMにより、作業員に対する作業内容の周知はよい	○	○
	19 KYの実施はよい	○	○
	23 ゴム手袋の着用前点検はよい	○	○
	24 電柱、支線の地盤点検を実施したか	○	○
	25 無断昇降柱上安全帯の使用前点検はよい	○	○
	26 フルハネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の点検状況はよい	○	○
	27 安全帯D環付近にフック取付時に錯覚しやすい物等が付いていないか	○	○
	28 昇降柱経路の確認はよい	○	○
	29 3点支持での昇降柱動作ができているか	○	○
	30 検電はよい	○	○
	31 昇降設備の設置状況はよい	○	○
	32 昇降用梯子等の使用状況はよい	○	○
	33 昇降動作はよい	○	○
柱上作業	36 フルハネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の使用状況はよい	○	○
	37 柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよい	○	○
	38 小柱への昇降方法は適切か	○	○
	39 防具の取付・取外方法はよい	○	○
	40 保護具・防具の使用はよい	○	○
	41 安全帯はよい	○	○
	42 フルハネスのフックの取付位置はよい	○	○
	43 通い網の使用方法はよい	○	○
足場・作業台	46 踏み抜き防止措置はよい	○	○
パトロール者所見 (状況により現場状況等も記入する。)			
フォローの要否		要・不要	

県協力会使用欄	センター使用欄
	24.1.30

重点	チェック項目	作業責任者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
計器工事	49 作業責任者は腕章等を着用しているか	○	○
	50 作業責任者の監督・指示は適切か	○	○
	52 作業開始前の点検はよい	○	○
	53 安全作業工具類 (計器工事用短絡防止キャップ・絶縁ドライバー・安全マスク) の使用はよい (計器活線時)	○	○
高所作業	57 設置場所はよい	○	○
	58 有資格者 (技能講習受講者) であるか	○	○
	59 高所作業車の操作方法はよい	○	○
	60 バックネット内での作業は適切か	○	○
	61 輪留めの活用状況はよい	○	○
	62 使用前の規制装置動作確認はよい	○	○
	63 高所作業車での安全作業・作業区域の確保は出来ているか	○	○
その他	65 公衆保安の確保 (談話員・セーフティコーン、作業区画の設置) はよい	○	○
	66 送電後の確認はよい	○	○
	67 個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか	○	○
	68 重量物の運搬・吊り上げ方法はよい	○	○
	69 自主検査はよい	○	○

安全確認事項	店舗パトロール	チェック欄
①	安全客室に関する指示 (ポスター・標識など)	
②	安全諸活動の記録の保管状況 (教育・KYなど)	
③	非常時の連絡体制図などの指示	
④		
⑤		
⑥	電気工事業務法 (建設業法) に基づく登録・届出	
⑦	電気工事業務の登録 (届出) 標識の掲示 (店舗・現場)	
⑧	労働者名簿・技能資格などの管理状況	
⑨	関係法令・規程類の整備状況 (電技・内規・電気工事2法等)	
⑩	しゅん工記録・自主点検表などの記録保管状況	
⑪		
⑫		
⑬	個人情報の取扱者の限定	
⑭	個人情報等を記した書類等の保管・管理状況 (持ち出し・施錠など)	
⑮	個人情報の複写等における取扱い・破棄の管理	
⑯		
⑰		
⑱	保護具・防具類の保管状況	
⑲	保護具・防具類の点検 (耐圧試験) 記録の保管状況	
⑳	工具類の点検整備状況と記録の保管状況	
㉑	測定器類の保管状況と点検 (校正試験) 記録の保管状況	
㉒	倉庫等の資機材の整理整頓状況	
㉓		
㉔		

フォローの実施結果 (実施月日: 月 日) 良・否	
県協力会使用欄	センター使用欄

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人

実施年月日	2024 年 1 月 30 日 (火)
実施時間	11:25 ~ 12:25
現場住所 引込柱	磐田市中泉 55モ11ア
直営班 (会社名)	(有)中泉電気工業
現場作業者名	岡田典久 遠藤和宏 椎葉幹彦 生子晴康 小林尊之
パトロール者所見	1. 交通量の多い歩道のある道路に、高所作業車を設置して交互通行にしている作業でした。 ・歩行者通路も確保され、交通誘導員も配置されていて良かったです。また、歩行者通路表示もされていました。） 2. お願い看板の設置も適所に設置され良かったです。 3. 交通量多かったですが、交通誘導員の適切な誘導がされていました。 4. 低圧防護必要ヶ所へ、適切に取付されていました。

※現場写真は別紙参照

安全パトロール

磐田市 中泉 55モ11ア

(有)中泉電気工業



安全パトロール票

実施年月日	令和 6 年 1 月 30 日 (火)
実施場所	磐田市中泉 55 号 11A
工事内容	吊引込 14D V3×1新設 (メッセン要)
パトロール対象	引込線工事・計器工事・屋内線工事・店舗
対象工事店名	南中泉電気工業
工事店区分	センター直営班・協力工事店A・協力工事店B・協力工事店C

県協力会使用欄	センター使用欄

重点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
一般	1 服装はよい	○	○
	2 作業人員は適正か	○	○
	3 「直営従業員名簿」記載の作業員か	○	○
	4 安全作業義務は携帯しているか	○	○
	5 健康状態はよい	○	○
	6 委託証は携帯しているか	○	○
出発前確認	11 工具・保護具・防具・活動用結束工具は損傷が無いうちに保管されているか	○	○
	12 作業現場に必要な工具、測定器具等の準備はできているか	○	○
	13 その他必要書類	○	○
作業中確認	18 TBMにより、作業者に対する作業内容の周知はよい	○	○
	19 K Yの実施はよい	○	○
昇降柱前点検	23 ゴム手袋の着用前点検はよい	○	○
	24 電柱、支線の地盤点検を実施したか	○	○
	25 無墜落柱上安全帯の使用前点検はよい	○	○
	26 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の点検状況はよい	○	○
	27 安全帯D環付近にフック取付時に錯覚しやすい物等が付いていないか	○	○
	28 昇柱経路の確認はよい	○	○
	29 3点支持での昇降柱動作ができているか	○	○
	30 検電はよい	○	○
	31 昇降設備の設置状況はよい	○	○
	32 昇柱用梯子等の使用状況はよい	○	○
	33 昇柱動作はよい	○	○
柱上作業	36 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の使用状況はよい	○	○
	37 柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよい	○	○
	38 小柱への昇柱方法は適切か	○	○
	39 防具の取付・取外方法はよい	○	○
	40 保護具・防具の使用はよい	○	○
	41 安全呼称はよい	○	○
	42 フルハーネスのフックの取付位置はよい	○	○
	43 通い綱の使用方法はよい	○	○
足場・作業台	46 踏み抜き防止措置はよい	○	○

パトローラー所見 (状況により現場状況等も記入する。)

フォローの要否
要・不要

重点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
計器工事	49 作業責任者は腕章等を着用しているか	○	○
	50 作業責任者の監視・指示は適切か	○	○
工事	52 作業開始前の点検はよい	○	○
	53 安全作業工具類 (計器工事用短絡防止キャップ・絶縁ドライバー・安全マスキ)の使用はよい (計器活動時)	○	○
高所作業車	57 設置場所はよい	○	○
	58 有資格者 (技能講習受講者) であるか	○	○
	59 高所作業車の操作方法はよい	○	○
	60 バックネット内での作業は適切か	○	○
	61 輪留めの活用状況はよい	○	○
	62 使用前の規制装置動作確認はよい	○	○
	63 高所作業車での安全作業・作業区域の確保は出来ているか	○	○
その他	65 公衆保安の確保 (誘導員・セーフティーコーン、作業区画の設置) はよい	○	○
	66 送電後の確認はよい	○	○
	67 個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか	○	○
	68 重量物の運搬・吊り上げ方法はよい	○	○
	69 自主検査はよい	○	○

重点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
安全啓蒙	1 安全啓蒙に関する掲示 (ポスター・標語など)	○	○
	2 安全諸活動の記録の保管状況 (教育・KYなど)	○	○
	3 非常時の連絡体制図などの掲示	○	○
法令関係	6 電気工事業法 (建設業法) に基づく登録・届出	○	○
	7 電気工事業の登録 (届出) 機種の掲示 (店舗・現場)	○	○
	8 労働者名簿・技能資格などの管理状況	○	○
	9 関係法令・規程類の管理状況 (電技・内規・電気工事2法等)	○	○
	10 しゅん工記録・自主点検表などの記録保管状況	○	○
	11	○	○
	12	○	○
個人情報	13 個人情報取扱者の限定	○	○
	14 個人情報等を記した書類等の保管・管理状況 (持ち出し・施設など)	○	○
	15 個人情報の複写等における扱いと返却・破棄の管理	○	○
	16	○	○
	17	○	○
防犯・安全管理	18 保護具・防具類の保管状況	○	○
	19 保護具・防具類の点検 (耐圧試験) 記録の保管状況	○	○
	20 工具類の点検整備状況と記録の保管状況	○	○
	21 測定器類の保管状況と点検 (校正試験) 記録の保管状況	○	○
	22 倉庫等の資機材の整理整頓状況	○	○
	23	○	○
	24	○	○

フォローの実施結果 (実施月: 月 日) 良・否

県協力会使用欄

センター使用欄

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人



実施年月日	2024 年 2 月 7 日 (水)
実施時間	10:00 ~ 11:10
現場住所 引込柱	菊川市中内田 53 5-6 カ 5 1 5
直営班 (会社名)	寺井電機(株)
現場作業者名	市川俊 水野昌彦 藤本久夫 伊藤 拓矢 山本晃大
パトロール者所見	1. TBM-KY 図面を見ながら説明がされていました。 1人KY口頭で実施されていました。 2. 交通量の多い道路に高所作業車を設置しての作業でした。 工事お願い看板を設置した方が良かったと思います。 3. 背中に低圧線が当たるかもしれない箇所へ、低圧防護がされていて良かったです。 4. 接続時の呼称・確認がされ接続がされていました。

※現場写真は別紙参照

安全パトロール

53カ
 菊川市中内田 507515

寺井電機(株)

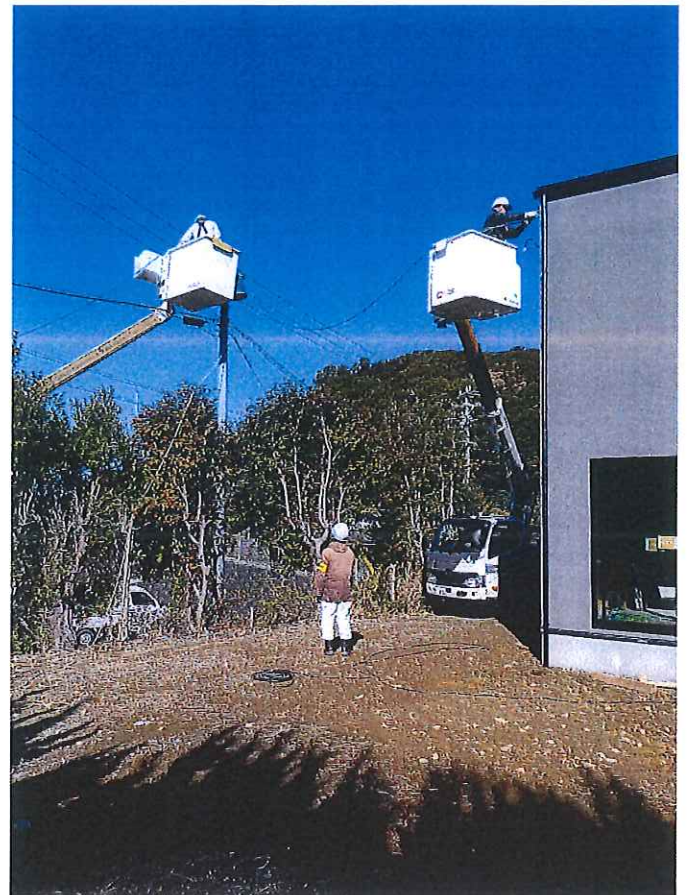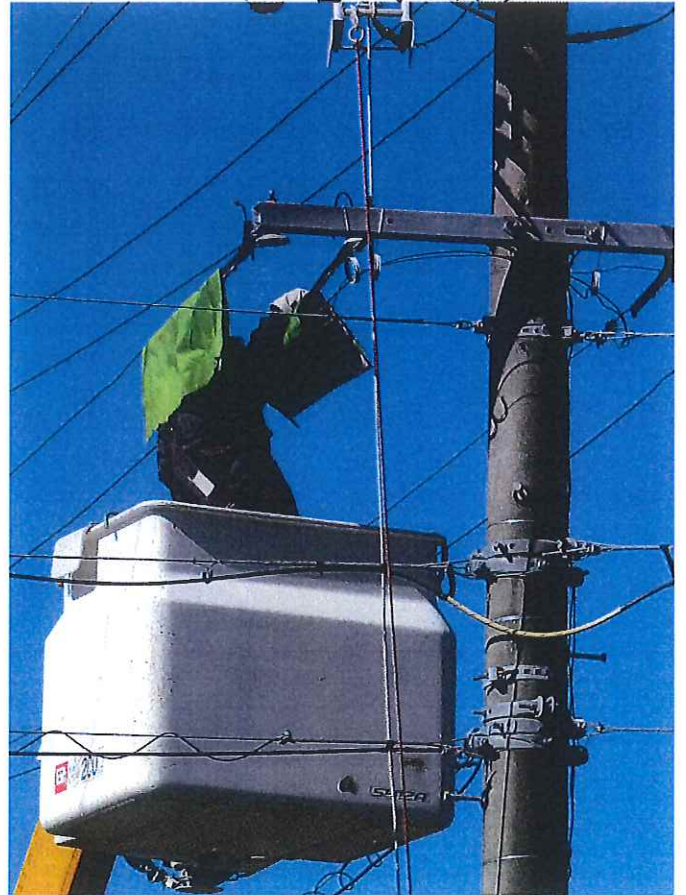

安全パトロール票

共同受注業務規程 (別紙8)

実施年月日	令和 6 年 2 月 7 日 (水)
実施場所	菊川市中内田 515
工事内容	14DV3×1 取付 (NTT柱継柱有)・臨時3.2DV2撤去
パトロール対象	引込線工事・計器工事・屋内線工事・店舗
対象工事店名	寺井電機㈱
工事店区分	(センター直営班)・協力工事店A・協力工事店B・協力工事店C

重点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
一般	1 防護はよい	○	○
	2 作業人員は適正か	○	○
	3 「直営従業員名簿」記載の作業員か	○	○
	4 安全作業必須は携帯しているか	○	○
	5 健康状態はよい	○	○
	6 委託証は携帯しているか	○	○
出発前確認	11 工具・保護具・防具・活線用絶縁工具は損傷がないように保管されているか		
	12 作業現場に必要な工具、測定器具等の準備はできているか		
	13 携行品はよい (電気工事士免状・運転免許証・安全必携・工事伝票・その他必要書類)		
	18 TBMにより、作業員に対する作業内容の周知はよい	○	○
	19 KYの実施はよい	○	○
昇降柱前点検	23 ゴム手袋の着用前点検はよい	○	
	24 電柱、支線の地盤点検を実施したか	○	
	25 無蓋落上安全帯の使用前点検はよい	○	
	26 フルハネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の点検状況はよい	○	
	27 安全帯D環付近にフック取付時に鑑賞しやすい物等が付いていないか	○	
	28 昇柱経路の確認はよい	○	
	29 3点支持での昇降柱動作ができているか	○	
	30 接電はよい	○	
	31 昇降設備の設置状況はよい	○	
	32 昇柱用梯子等の使用状況はよい	○	
	33 昇柱動作はよい	○	
柱上作業	36 フルハネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の使用状況はよい	○	
	37 柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよい	○	
	38 小柱への昇柱方法は適切か	○	
	39 防具の取付・取外方法はよい	○	
	40 保護具・防具の使用はよい	○	
	41 安全呼称はよい	○	
	42 フルハネスのフックの取付位置はよい	○	
	43 通い綱の使用方法はよい	○	
足場・作業	46 踏み抜き防止措置はよい	○	

パトロール者所見 (状況により現場状況等も記入する。)

フォローの要否

要・不要

県協力会使用欄	センター使用欄

重点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
作業の開始前確認	49 作業責任者は腕章等を着用しているか	○	○
	50 作業責任者の監視・指示は適切か	○	○
計器工事	52 作業開始前の点検はよい	○	
工具	53 安全作業工具類 (計器工事用短絡防止キャップ・絶縁ドライバー・安全マスキ) の使用はよい (計器活線時)	○	
高所作業車	57 設置場所はよい	○	
	58 有資格者 (技能講習受講者) であるか	○	
	59 高所作業車の操作方法はよい	○	
	60 バケット内での作業は適切か	○	
	61 輪留めの活用状況はよい	○	
	62 使用前の規制装置動作確認はよい	○	
	63 高所作業車での安全作業・作業区域の確保は出来ているか	○	
その他	65 公衆保安の確保 (誘導員・セーフティコーン、作業区画の設置) はよい	○	
	66 送電後の確認はよい	○	
	67 個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか	○	
	68 重量物の運搬・吊り上げ方法はよい	○	
	69 自主検査はよい	○	

安全監査に関する指示 (ポスター・標語など)	店舗パトロール チェック欄
1 安全監査に関する指示 (ポスター・標語など)	
2 安全諸活動の記録の保管状況 (教育・KYなど)	
3 非常時の連絡体制図などの掲示	
4	
5	
6 電気工事業法 (建設業法) に基づく登録・届出	
7 電気工事業の登録 (届出) 標識の掲示 (店舗・現場)	
8 労働者名簿・技能資格などの管理状況	
9 関係法令・規程類の常備状況 (電技・内規・電気工事2法等)	
10 しゅん工記録・自主点検表などの記録保管状況	
11	
12	
13 個人情報取扱いの取扱い	
14 個人情報を記した書類等の保管・管理状況 (持ち出し・施錠など)	
15 個人情報の複写等における扱いと返却・破棄の管理	
16	
17	
18 保護具・防具類の保管状況	
19 保護具・防具類の点検 (耐圧試験) 記録の保管状況	
20 工具類の点検整備状況と記録の保管状況	
21 測定器類の保管状況と点検 (校正試験) 記録の保管状況	
22 倉庫等の資機材の整理整頓状況	
23	
24	

フォローの実施結果 (実施月日: 月 日) 良・否

県協力会使用欄	センター使用欄

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人



実施年月日	2024 年 2 月 7 日 (水)
実施時間	11:25 ~ 12:40
現場住所 引込柱	掛川市中内田 00ア327
直営班 (会社名)	寺井電機㈱
現場作業者名	市川俊 水野昌彦 藤本久夫 伊藤 拓矢 山本晃大
パトロール者所見	1. TBM-KY 図面を見ながら説明がされていました。 2. 一方通行の道路に車両を設置しての工事でした。 通行車両に対して、交通誘導員による適切な誘導がされていました。 3. 必要箇所に低圧防護がされていました。 4. 38DV3×2 の吊引込取付の工事でした。お互いに連携をとり、DV線の延線がされていました。

※現場写真は別紙参照

安全110トロール

掛川市紺屋町 00ア327

寺井電機(株)

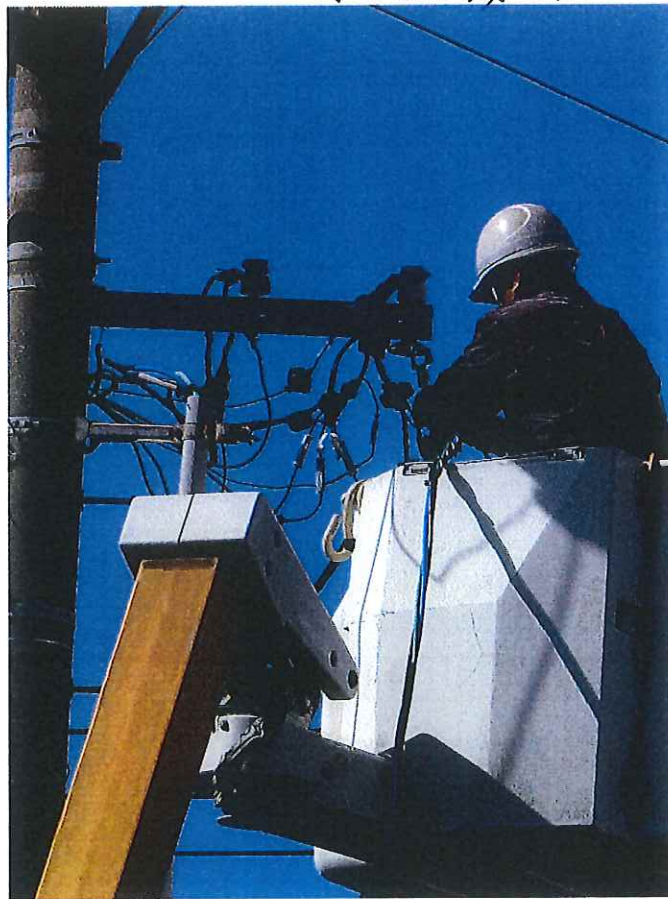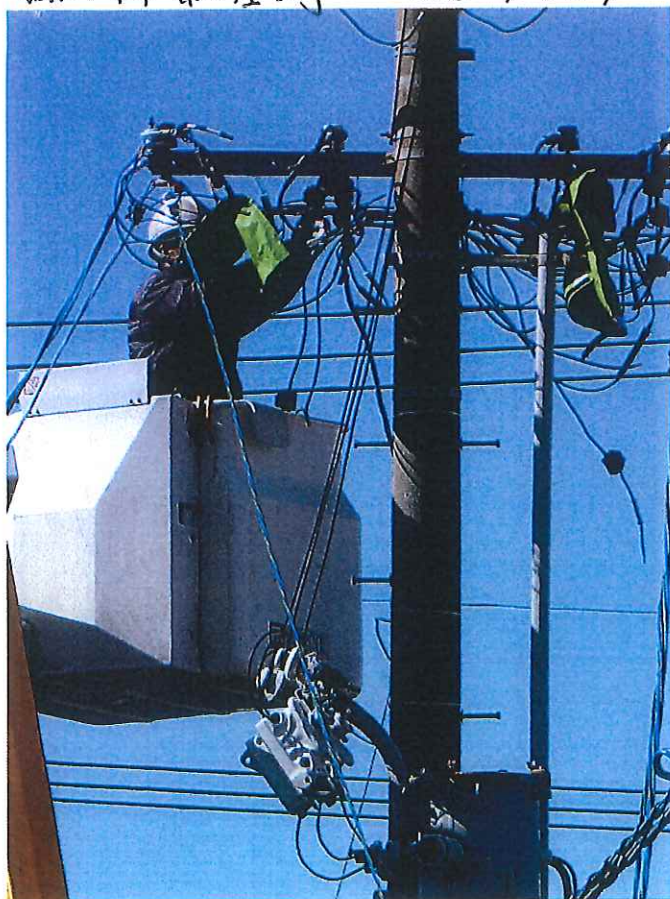

安全パトロール票

共同受注業務規程 (別紙8)

実施年月日	令和 6 年 2 月 7 日 (水)
実施場所	掛川市紺屋町 00ア327
工事内容	38DV3×2 吊引込取付 (電灯・動力)
パトロール対象	引込線工事・計器工事・屋内線工事・店舗
対象工事店名	寺井電機株式会社
工事店区分	センター直営班・協力工事店A・協力工事店B・協力工事店C

県協力会使用欄	センター使用欄
	

重点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
一般	1 服装はよい	○	○
	2 作業人員は適正か	○	○
	3 「直営従業員名簿」記載の作業員か	○	○
	4 安全作業必須は携帯しているか	○	○
	5 健康状態はよい	○	○
	6 委託証は携帯しているか	○	○
出発前	11 工具・保護具・防具・活線用絶縁工具は損傷が無くように保管されているか	○	○
確認	12 作業現場に必要な工具・測定器具等の準備はできているか	○	○
	13 携行品はよい (電気工事士免許・運転免許証・安全必修・工事位置票・その他必要書類)	○	○
昇降柱前点検	18 TBMにより、作業者に対する作業内容の周知はよい	○	○
	19 K Y の実施はよい	○	○
	23 ゴム手袋の着用前点検はよい	○	○
	24 電柱・支線の地盤点検を実施したか	○	○
	25 無懸落柱上安全帯の使用前点検はよい	○	○
	26 フルハーネス (懸落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の点検状況はよい	○	○
	27 安全帯D環付近にフック取付時に錆や物等が付いていないか	○	○
	28 昇降柱の経路の確認はよい	○	○
	29 3点支持での昇降柱動作ができています	○	○
	30 検電はよい	○	○
	31 昇降設備の設置状況はよい	○	○
	32 昇降用梯子等の使用状況はよい	○	○
	33 昇降動作はよい	○	○
柱上作業	36 フルハーネス (懸落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の使用状況はよい	○	○
	37 柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよい	○	○
	38 小柱への昇降方法は適切か	○	○
	39 防具の取付・取外方法はよい	○	○
	40 保護具・防具の使用はよい	○	○
	41 安全呼称はよい	○	○
	42 フルハーネスのフックの取付位置はよい	○	○
	43 通い綱の使用方法はよい	○	○
足場・保護具・防具類の管理	46 踏み抜き防止措置はよい	○	○

パトローラー者所見 (状況により現場状況等も記入する。)

フォローの要否	要・不要
---------	------

重点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
計器工事	49 作業責任者は腕章等を着用しているか	○	○
	50 作業責任者の監視・指示は適切か	○	○
高所作業車	52 作業開始前の点検はよい	○	○
	53 安全作業工具類 (計器工用短絡防止キャップ・絶縁ドライバー・安全マスキ) の使用はよい (計器活動時)	○	○
	57 設置場所はよい	○	○
	58 有資格者 (技能講習受講者) であるか	○	○
	59 高所作業車の操作方法はよい	○	○
	60 バケット内での作業は適切か	○	○
	61 輪留めの活用状況はよい	○	○
	62 使用前の強制装置動作確認はよい	○	○
	63 高所作業車での安全作業・作業区域の確保は出ているか	○	○
その他	65 公衆保安の確保 (誘導員・セーフティコーン・作業区画の設置) はよい	○	○
	66 送電後の確認はよい	○	○
	67 個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか	○	○
	68 重量物の運搬・吊り上げ方法はよい	○	○
	69 自主検査はよい	○	○

安全作業管理	店舗パトロール	チェック欄
◎ 1 安全啓蒙に関する掲示 (ポスター・標識など)		
◎ 2 安全諸活動の記録の保管状況 (教育・KYなど)		
◎ 3 非常時の連絡体制図などの掲示		
4		
5		
◎ 6 電気工事業法 (建設業法) に基づく登録・届出		
◎ 7 電気工事業の登録 (届出) 標識の掲示 (店舗・現場)		
◎ 8 労働者名簿・技能資格などの管理状況		
◎ 9 関係法令・規程類の常備状況 (電技・内規・電気工事2法等)		
◎ 10 しゅん工記録・自主点検表などの記録保管状況		
11		
12		
◎ 13 個人情報取扱いの取扱い		
◎ 14 個人情報取扱いの取扱い (持ち出し・施錠など)		
◎ 15 個人情報の複製等における取扱いと返却・廃棄の管理		
16		
17		
◎ 18 保護具・防具類の保管状況		
◎ 19 保護具・防具類の点検 (耐圧試験) 記録の保管状況		
◎ 20 工具類の点検整備状況と記録の保管状況		
◎ 21 測定器類の保管状況と点検 (校正試験) 記録の保管状況		
◎ 22 倉庫等の資機材の整理整頓状況		
23		
24		

フォローの実施結果 (実施月: 月 日)	良・否
県協力会使用欄	センター使用欄
	

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人



実施年月日	2024 年 2 月 14 日 (水)
1. 実施時間	8 : 35 ~ 10 : 00
現場住所 引込柱	御前崎市門屋 63-924
直営班 (会社名)	浜電工業(株)
現場作業者名	本杉亘 松浦俊行 松田稜詞 大串和樹
パトロール者所見	1. KYは口頭で監督者から危険個所を指示する事で実施されていた。 2. DV線を直接地面に置かず、DV線の下に毛布が敷かれ、DV線の保護がされていて良かったです。 3. 交差点の角に高所作業車を設置しての作業であったが、右折車等、交通誘導員の誘導がされていた。 4. 検電, 高所輪止めの設置状況, 高所地切り状況良好でした。

※現場写真は別紙参照

安全ハトロー

御前崎市門屋 630924

浜電工業(株)

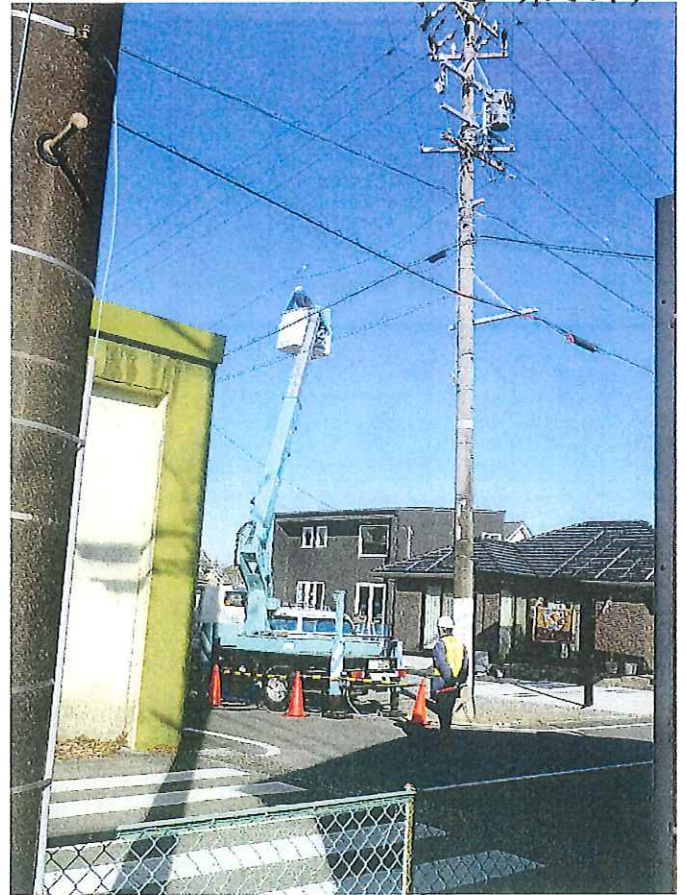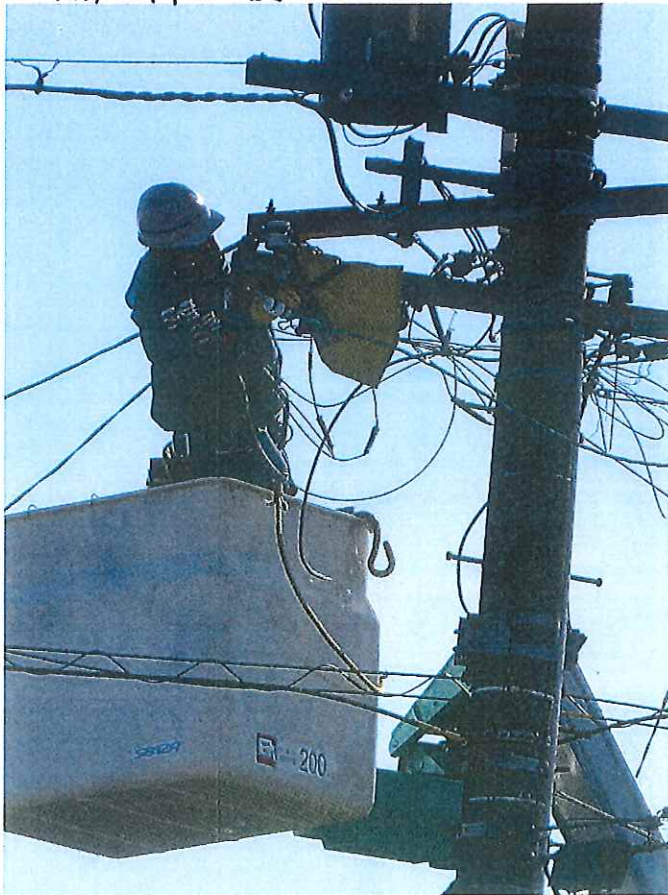

24.2.14

安全パトロール票

共同受注業務規程 (別紙8)

実施年月日	令和 6年 2月 14日 (水)
実施場所	御前崎市門屋 630924
工事内容	38DV3メッセン吊新設 臨時3.2DV3撤去 メーター取付、撤去
パトロール対象	引込線工事・計器工事・屋内線工事・店舗
対象工事店名	浜電工業㈱
工事店区分	センター直営班・協力工事店A・協力工事店B・協力工事店C
重点	チェック項目
1 服装はよい	作業員は通正か
2 作業人員は通正か	作業員は通正か
3 「直営従業員名簿」記載の作業員か	作業員は通正か
4 安全作業必須は携帯しているか	作業員は通正か
5 健康状態はよい	作業員は通正か
6 委託証は携帯しているか	作業員は通正か
11 工具・保護具・防具・活用絶縁工具は損傷が無いように保管されているか	作業員は通正か
12 作業現場に必要な工具、測定器具等の準備はできているか	作業員は通正か
13 携行品はよい (電気工事士免状・運転免許証・安全必携・工事伝票・その他必要書類)	作業員は通正か
18 TBMにより、作業員に対する作業内容の周知はよい	作業員は通正か
19 KYの実施はよい	作業員は通正か
23 ゴム手袋の着用前点検はよい	作業員は通正か
24 電柱・支線の地盤点検を実施したか	作業員は通正か
25 無墜落柱上安全帯の使用前点検はよい	作業員は通正か
26 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の点検状況はよい	作業員は通正か
27 安全帯D環付近にフック取付時に錆臭いや物等が付いていないか	作業員は通正か
28 昇降経路の確認はよい	作業員は通正か
29 3点支持での昇降柱動作ができているか	作業員は通正か
30 検電はよい	作業員は通正か
31 昇降設備の設置状況はよい	作業員は通正か
32 昇降用梯子等の使用状況はよい	作業員は通正か
33 昇降柱動作はよい	作業員は通正か
36 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジショニング用器具) の使用状況はよい	作業員は通正か
37 柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよい	作業員は通正か
38 小柱への昇降方法は適切か	作業員は通正か
39 防具の取付・取外方法はよい	作業員は通正か
40 保護具・防具の使用はよい	作業員は通正か
41 安全帯はよい	作業員は通正か
42 フルハーネスのフックの取付位置はよい	作業員は通正か
43 通い綱の使用方法はよい	作業員は通正か
46 踏み抜き防止措置はよい	作業員は通正か
パトロール者所見 (状況により現場状況等も記入する。)	

県協力会使用欄	センター使用欄
重点	チェック項目
49 作業責任者は腕章等を着用しているか	作業員は通正か
50 作業責任者の監視・指示は適切か	作業員は通正か
52 作業開始前の点検はよい	作業員は通正か
53 安全作業工具類 (計器工事項短絡防止キャップ・絶縁ドライバー・安全マスク) の使用はよい (計器活線時)	作業員は通正か
57 設置場所はよい	作業員は通正か
58 有資格者 (技能講習受講者) であるか	作業員は通正か
59 高所作業車の操作方法はよい	作業員は通正か
60 バックネット内での作業は適切か	作業員は通正か
61 輪留めの活用状況はよい	作業員は通正か
62 使用前の規制装置動作確認はよい	作業員は通正か
63 高所作業車での安全作業・作業区域の確保は出来ているか	作業員は通正か
65 公衆保安の確保 (談話員・セーフティコーン・作業区画の設置) はよい	作業員は通正か
66 送電後の確認はよい	作業員は通正か
67 個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか	作業員は通正か
68 重物の運搬・吊り上げ方法はよい	作業員は通正か
69 自主検査はよい	作業員は通正か
その他	
安全啓蒙に関する掲示 (ポスター・標識など)	作業員は通正か
安全諸活動の記録の保管状況 (教育・KYなど)	作業員は通正か
非常時の連絡体制図などの掲示	作業員は通正か
電気工事業法 (建設業法) に基づく登録・届出	作業員は通正か
電気工事業の登録 (届出) 標識の掲示 (店舗・現場)	作業員は通正か
労働者名簿・技能資格などの管理状況	作業員は通正か
関係法令・規程類の常備状況 (電技・内規・電気工事2法等)	作業員は通正か
しゅん工記録・自主点検表などの記録保管状況	作業員は通正か
個人情報情報の取扱者の限定	作業員は通正か
個人情報情報を記した書類等の保管・管理状況 (持ち出し・施設など)	作業員は通正か
個人情報の複写等における扱いと返却・破棄の管理	作業員は通正か
保護具・防具類の保管状況	作業員は通正か
保護具・防具類の点検 (耐圧試験) 記録の保管状況	作業員は通正か
工具類の点検整備状況と記録の保管状況	作業員は通正か
測定器類の保管状況と点検 (校正試験) 記録の保管状況	作業員は通正か
倉庫等の資機材の整理整頓状況	作業員は通正か
フォロワーの実施結果 (実施月日: 月 日) 良・否	
県協力会使用欄	センター使用欄

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人



実施年月日	2024 年 2 月 21 日 (水)
実施時間	10:30 ~ 11:30
現場住所 引込柱	磐田市豊島 57ヤ262
直営班 (会社名)	(有)中泉電気工業
現場作業者名	岡田典久 遠藤和宏 椎葉幹彦 生子晴康 小林尊之
パトロール者所見	1. TBM-KY 監督者は図面を見ながら作業内容の説明がされ、また、1人KYが実施されていました。 作業終了後も作業の反省が実施されていました。 2. お願い看板、矢印看板も適所に設置され良かったです。 3. 最初に低圧防護されていました。低圧活線接続時は、接続部分だけ出し接続がされていて良かったです。監督者の重点監視もされていました。 4. 高所作業車の輪止めの取付、ジャッキアップ時の地切りが確実に実施されていました。

※現場写真は別紙参照

安全 パトロール

磐田市豊島 57ヤ262

(有)中泉電気工業

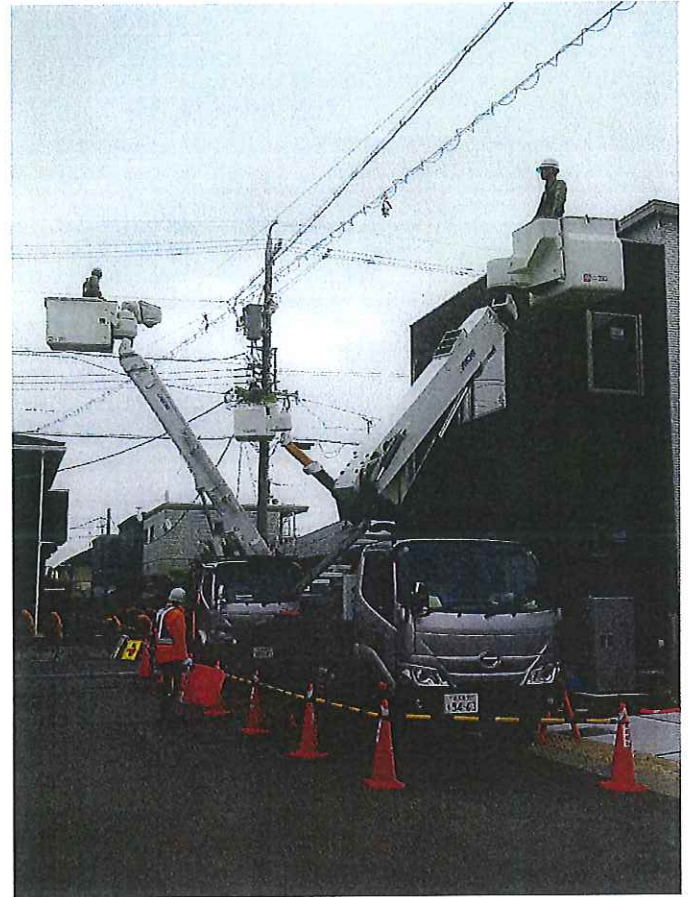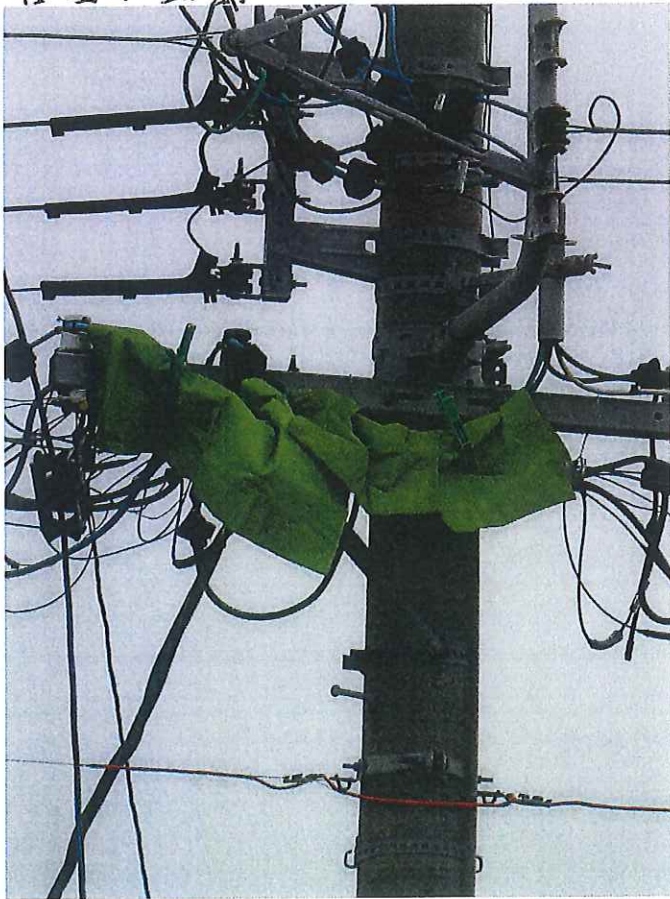

安全パトロール票

共同受注業務規程 (別紙 8)

実施年月日	令和 6 年 2 月 21 日 (水)
実施場所	磐田市豊島 57ヤ262
工事内容	14DV3×1吊引込新設
パトロール対象	引込線工事・計器工事・屋内線工事・店舗
対象工事店名	南中泉電気工業
工事店区分	センター直営班・協力工事店A・協力工事店B・協力工事店C

重点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
一般	1 服装はよい	○	○
	2 作業人員は適正か	○	○
	3 「直営従業員名簿」記載の作業員か	○	○
	4 安全作業必須は携帯しているか	○	○
	5 健康状態はよい	○	○
	6 委託証は携帯しているか	○	○
出発前	11 工具・保護具・防具・活用絶縁工具は損傷が無いように保管されているか	○	○
確認	12 作業現場に必要な工具・測定器具等の準備はできているか	○	○
	13 携行品はよい (電気工事士免状・運転免許証・安全必須・工事伝票・その他必要書類)	○	○
	18 TBMにより、作業者に対する作業内容の周知はよい	○	○
	19 KYの実施はよい	○	○
	23 ゴム手袋の着用前点検はよい	○	○
	24 電柱・支線の地盤点検を実施したか	○	○
	25 無落着柱上安全帯の使用前点検はよい	○	○
昇降柱前点検	26 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジションニング用器具) の点検状況はよい	○	○
	27 安全帯D環付近にフック取付時に錯覚しやすい物等が付いていないか	○	○
	28 昇降設備の点検状況はよい	○	○
	29 3点支持での昇降動作ができているか	○	○
	30 検電はよい	○	○
	31 昇降設備の設置状況はよい	○	○
	32 昇降用梯子等の使用状況はよい	○	○
	33 昇降動作はよい	○	○
柱上作業	36 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジションニング用器具) の使用状況はよい	○	○
	37 柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよい	○	○
	38 小柱への昇降方法は適切か	○	○
	39 防具の取付・取外方法はよい	○	○
	40 保護具・防具の使用はよい	○	○
	41 安全呼称はよい	○	○
	42 フルハーネスのフックの取付位置はよい	○	○
	43 通い綱の使用方法是よい	○	○
監視・指導	46 踏み抜き防止措置はよい	○	○

パトロール者所見 (状況により現場状況等も記入する。)

フォローの要否	要・不要
---------	------

県協力会使用欄	センター使用欄
---------	---------

重点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
作業現場	49 作業責任者は腕章等を着用しているか	○	○
計器工事	50 作業責任者の監視・指示は適切か	○	○
	52 作業開始前の点検はよい	○	○
	53 安全作業工具類 (計器工事用短絡防止キャップ・絶縁ドライバー・安全マスク) の使用はよい (計器活動時)	○	○
高所作業	57 設置場所はよい	○	○
	58 有資格者 (技能講習受講者) であるか	○	○
	59 高所作業車の操作方法はよい	○	○
	60 バックネット内での作業は適切か	○	○
	61 輪留めの活用状況はよい	○	○
	62 使用前の規制装置動作確認はよい	○	○
	63 高所作業車での安全作業・作業区域の確保は出ているか	○	○
その他	65 公衆保安の確保 (誘導員・セーフティコーン・作業区画の設置) はよい	○	○
	66 送電後の確認はよい	○	○
	67 個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか	○	○
	68 重量物の運搬・吊り上げ方法はよい	○	○
	69 自主検査はよい	○	○

重点	チェック項目	作業者 チェック欄
安全啓蒙	1 安全啓蒙に関する掲示 (ポスター・標語など)	○
	2 安全諸活動の記録の保管状況 (教育・KYなど)	○
	3 非常時の連絡体制図などの掲示	○
	4	○
	5	○
安全関係図書	6 電気工事業法 (建設業法) に基づく登録・届出	○
	7 電気工事業の登録 (届出) 標識の掲示 (店舗・現場)	○
	8 労働者名簿・技能資格などの管理状況	○
	9 関係法令・規程類の常備状況 (電技・内規・電気工事2法等)	○
	10 しゅん工記録・自主点検表などの記録保管状況	○
	11	○
	12	○
個人情報	13 個人情報の取扱者の限定	○
	14 個人情報を書類等の保管・管理状況 (持ち出し・施錠など)	○
	15 個人情報の複写等における扱いと返却・破棄の管理	○
	16	○
	17	○
防具・保護具・作業具の管理	18 保護具・防具類の保管状況	○
	19 保護具・防具類の点検 (耐圧試験) 記録の保管状況	○
	20 工具類の点検整備状況と記録の保管状況	○
	21 測定器類の保管状況と点検 (校正試験) 記録の保管状況	○
	22 倉庫等の資機材の整理整頓状況	○
	23	○
	24	○

フォローの実施結果 (実施月: 月 日)	良・否
県協力会使用欄	センター使用欄

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】


作成者： 高塚 勝人

実施年月日	2024 年 2 月 28 日 (水)
実施時間	10:45 ~ 11:55
現場住所 引込柱	掛川市東山 07キ391
直営班 (会社名)	寺井電機㈱
現場作業者名	水野昌彦 藤本久夫 伊藤 拓矢
パトロール者所見	1. TBM-KY 図面を見ながら説明がされていました。 1人KY口頭で実施されていました。 2. 高所作業車使えない為、柱上からの作業でした。 3. 先方柱への昇柱は梯子使用でした。梯子の上部、下部2ヶ所で 転倒防止措置が実施されていて良かったです。 4. 接続後の結線確認実施されていました。 5. 監督者作業全体の監督及び低圧活線時は重点監視が実施されて いました。



※現場写真は別紙参照

安全ハートロー

掛川市東山 07キ391

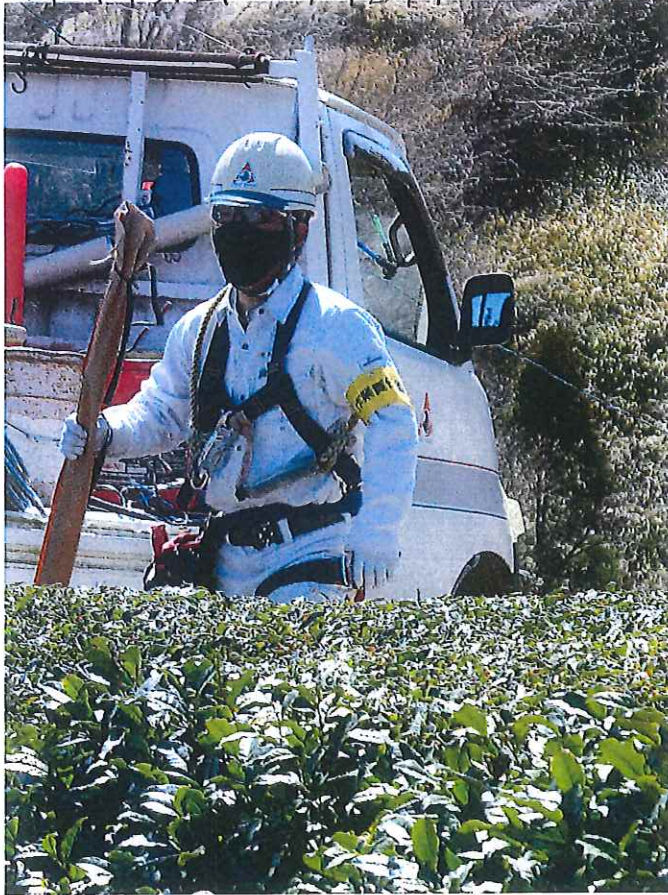

寺井電機(株)

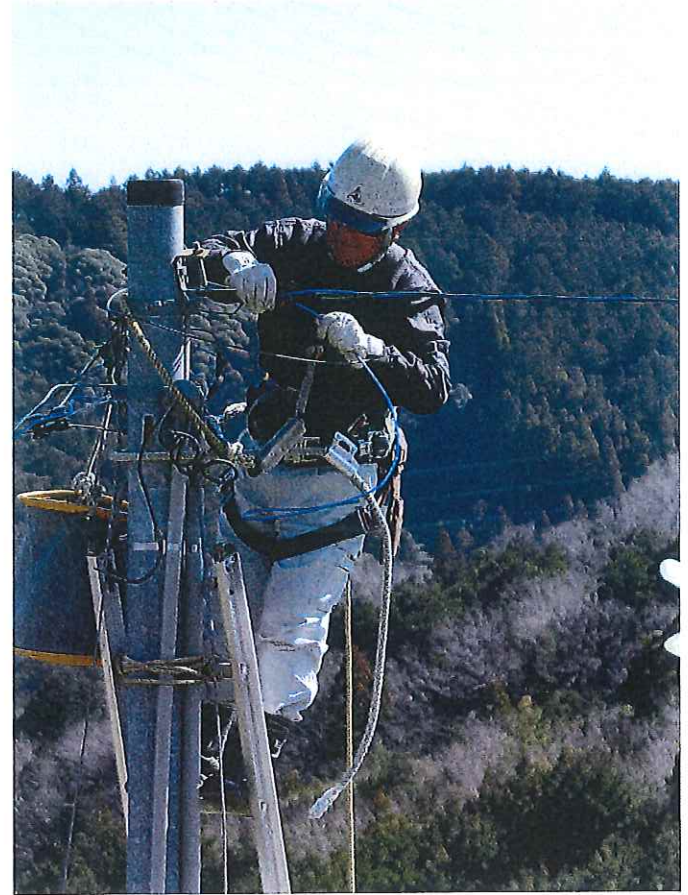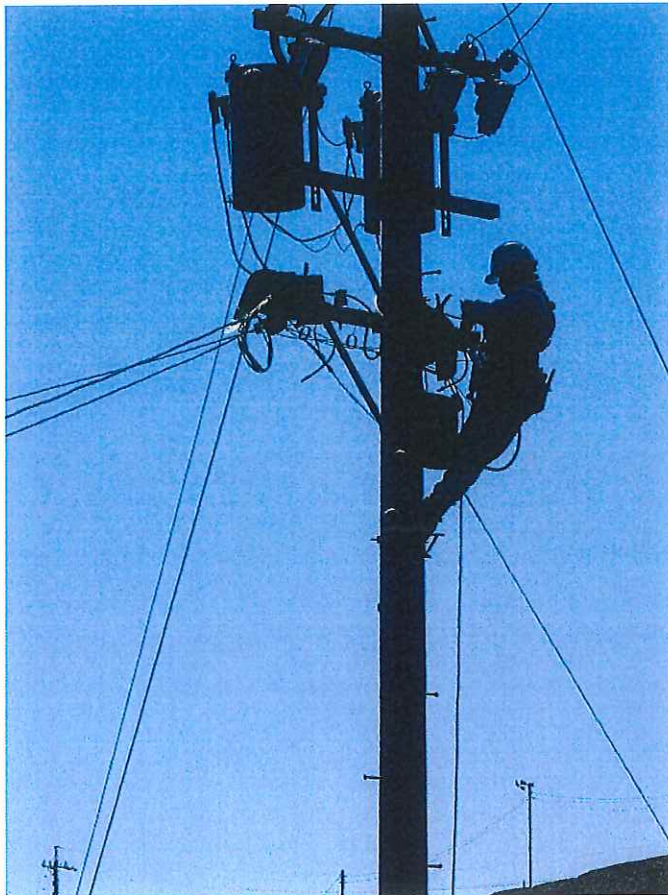

24.2.28

共同受注業務規程（別紙8）

実施年月日	令和 6 年 2 月 28 日 (水)
実施場所	掛川市東山 07キ391
工事内容	2. 6DV3×1 (動力) 取付
パトロール対象	(引込線工事) ・ 計器工事 ・ 屋内線工事 ・ 店舗
対象工事店名	寺井電機㈱
工事店区分	(センター直営班) ・ 協力工事店A ・ 協力工事店B ・ 協力工事店C

重点	チェック項目	作業者 チェッカー欄	作業責任者 チェッカー欄
一般	1 服装はよいのか	○	○
	2 作業人員は適正か	○	○
	3 「区画従業員名簿」記載の作業員か	○	○
	4 安全作業必携は携帯しているか	○	○
	5 健康状態はよいのか	○	○
出発前の確認	6 委託証は携帯しているか	○	○
	7 工具・保護具・防具・活線用絶縁工具有は損傷が無いように保管されているか	○	○
	8 作業現場に必要な工具、測定器具等の準備はできているか	○	○
	9 携行品はよいのか (電気工事士免状・運転免許証・安全必携・工事伝票・その他必要書類)	○	○
	10	○	○
	11 TBMにより、作業者に対する作業内容の周知はよいのか	○	○
	12 KYの実施はよいのか	○	○
	13 ゴム手袋の着用前点検はよいのか	○	○
	14 電柱、支線の地際点検を実施したか	○	○
	15 無塵落柱上安全帯の使用前点検はよいのか	○	○
昇降柱前点検	16 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジションニング用器具) の点検状況はよいのか	○	○
	17 安全帯D環付近にフック取付時に懸賞しやすい物等が付いていないか	○	○
	18 昇柱経路の確認はよいのか	○	○
	19 3点支持での昇降柱動作ができているか	○	○
	20 検電は良いか	○	○
	21 昇降設備の設置状況はよいのか	○	○
	22 昇柱用梯子等の使用状況はよいのか	○	○
	23 昇柱動作はよいのか	○	○
	24	○	○
	25	○	○
柱上作業	26 フルハーネス (墜落制止用器具) および安全帯 (ワークポジションニング用器具) の使用状況はよいのか	○	○
	27 柱上作業姿勢、安定した足場の確保はよいのか	○	○
	28 小柱への昇柱方法は適切か	○	○
	29 防具の取付・取外方法はよいのか	○	○
	30 保護具・防具の使用はよいのか	○	○
	31 安全呼籲はよいのか	○	○
	32 フルハーネスのフックの取付位置はよいのか	○	○
	33 正しい細の使用方法はよいのか	○	○
	34	○	○
	35	○	○
監視上注意	36 踏み抜き防止措置はよいのか	○	○
	37	○	○

パトローラー者所見 (状況により現場状況等も記入する。)

フォローの要否
要・不要

県協力会 使用欄	セ ン タ ー 使 用 欄	   
-------------	---------------------------------	--

重点	チェック項目	作業者 チェック欄	作業責任者 チェック欄
作 業 の 実 施 者 の 注 意 点			
◎	49 作業責任者は腕章等を着用しているか	—	○
	50 作業責任者の監視・指示は適切か	—	○
計 器 工 事			
	52 作業開始前の点検はよいか	—	—
	53 安全作業工具類（計器工事用短絡防止キャップ・絶縁ドライバー・安全マスキング）の使用はよいか（計器活線時）	—	—
高 所 作 業 車			
	57 設置場所はよいか	—	—
	58 有資格者（技能講習受講者）であるか	—	—
◎	59 高所作業車の操作方法はよいか	—	—
	60 バケット内での作業は適切か	—	—
	61 輪留めの活用状況はよいか	—	—
◎	62 使用前の規制装置動作確認はよいか	—	—
	63 高所作業車での安全作業・作業区域の確保は出来ているか	—	—
	65 公衆保安の確保（誘導員・セーフティコーン、作業区画の設置）はよいか	○	—
	66 送電後の確認はよいか	○	—
	67 個人情報保護に関する措置は適切に出来ているか	○	—
そ の 他	68 重量物の運搬・吊り上げ方法はよいか	—	—
	69 自主検査はよいか	○	○

店舗パトロール	チェック欄
安全警報に関する掲示（ポスター・標語など）	◎
安全諸活動の記録の保管状況（教育・KYなど）	◎
非常時の連絡体制図などの掲示	◎
	4
	5
電気工事業法（建設業法）に基づく登録・届出	◎
電気工事業の登録（届出）標識の掲示（店舗・現場）	◎
労働者名簿・技能資格などの管理状況	◎
関係法令・規程類の常備状況（電技・内規・電気工事2法等）	◎
しゅん工記録・自主点検表などの記録保管状況	◎
	11
	12
個人情報取扱者の限定	◎
個人情報取扱を記した書類等の保管・管理状況（持ち出し・施設など）	◎
個人情報の複写等における扱い・破棄の管理	◎
	15
	16
	17
保護具・防具類の保管状況	◎
保護具・防具類の点検（耐圧試験）記録の保管状況	◎
工具類の点検整備状況と記録の保管状況	◎
測定器類の保管状況と点検（校正試験）記録の保管状況	◎
倉庫等の資機材の整理整頓状況	◎
	23
	24

フォローの実施結果（実施月日： 月 日） 良・否

県協力会使用欄		センター使用欄	
